



F-0050

570186
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
7 SEP 2020 Hora: 9:30

ORD N° : 100/2020
REF. : Resolución Exenta 1422 .Fecha 05.08.2020.
Protocolo de Acuerdo GORE-FA.
MAT : Solicitud de suplementación y re-itemización
de recursos para el proyecto: Restauración iglesia
Virgen de La Asunción de Tichámar. Cod. Bip N°
40003075-0"

En Arica, 4 de septiembre de 2020

Sr. Humberto Saavedra
Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
PRESENTE

Estimado Humberto:

Junto con saludar cordialmente y agradeciendo la supervisión y apoyo al trabajo de sub-ejecución PPVP que presta Fundación Altiplano (FA) a Gobierno Regional de Arica y Parinacota (GORE), venimos a solicitar formalmente la suplementación y correspondiente re-itemización de recursos para el proyecto "Restauración iglesia Virgen de La Asunción de Tichámar Código Bip N° 40003075-0". Junto a esta carta, se entrega el informe técnico y financiero detallado que da cuenta del estado de avance de la iniciativa y de la suplementación requerida.

Esta solicitud se realiza en correspondencia con el Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Fundación Altiplano, Resolución exenta N°1422 con fecha 5 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19, haciendo referencia específica a la cláusula Tercera: Compromiso del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Hacemos ver que la continuidad de la sub-ejecución de la iniciativa referida, de acuerdo al convenio vigente, exige un esfuerzo extraordinario de la entidad sub-ejecutora, asumiendo ésta costos, riesgos y dificultades extraordinarias y nunca previstas, derivadas de la Emergencia mundial COVID-19 que nos afecta, que vienen a aumentar la alta complejidad de esta iniciativa patrimonial que ha requerido el servicio de sub ejecución PPVP. La disposición de la Fundación Altiplano como entidad sub-ejecutora no responde a ningún incentivo económico, que no existe para ninguna iniciativa de sub ejecución PPVP, sino sólo al compromiso de apoyo adquirido con la comunidad del templo de Tichámar, en sintonía con la misión institucional de acompañar a comunidades que necesitan conservar sus tesoros patrimoniales. Para poder lograr cumplir con la restauración del templo en estas condiciones de extrema emergencia, será necesario contar con la mayor colaboración posible de parte de Gobierno Regional, Comunidad del Templo y de todas las instituciones vinculadas al proceso.

Solicitud de suplementación.

Según se estableció en la solicitud de Modalidad Flexible de sub-ejecución y al Protocolo de acuerdo de resolución exenta N° 1422 del 5 de agosto de 2020 en su punto N° 3 se procede a solicitar el aumento de presupuesto para cubrir los gastos imprevistos derivados de la Emergencia COVID-19, que responden a los gastos operacionales realizados durante los cinco meses de pausa parcial de operaciones del proyecto y a la implementación del campamento

temporal aislado y autónomo solicitado por la comunidad de Ticnámar para la reanudación de las obras.

El sobre costo total es de \$ 153.307.460, lo que equivale a 24% del presupuesto inicial firmado en convenio del 16 de octubre de 2019.

En la **Tabla 1** se expone comparativamente el presupuesto aprobado en convenio vigente, el monto rendido a la fecha actual y el nuevo presupuesto resultante, con detalle del reajuste por partida y su respectivo déficit o sobre costo. Estos sobrecostos se justifican por:

- El aumento de presupuesto en la partida N°1, se debe al costo de la implementación de un campamento temporal aislado demandado por la comunidad para el inicio de las obras y a las medidas adaptadas a la contingencia sanitaria.
- El aumento en la partida N°13, se debe al cambio de EETT, en la partida de Obras Complementarias, subpartida 13.2 Sobrecubierta temporal, declarada en el proyecto de restauración y que se ha debido adecuar a la normativa vigente exigida en la LGUC (Ley General de Urbanismo y Construcciones).
- El aumento de presupuesto en la partida N° 15 de gastos generales corresponde a gastos operacionales realizados durante la pausa parcial de operaciones y a las necesidades requeridas para cumplir con los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias y requerimientos de comunidad y equipo de trabajo.

Con la suplementación presupuestaria solicitada se podría completar el 100% de las partidas de obra declaradas en el proyecto a fecha 31 de mayo de 2021. Esto supondría un aumento de 4 meses en la duración del proyecto respecto al tiempo declarado en convenio. Sin la suplementación presupuestaria no se podría completar el 100% del proyecto, y se declararía el cierre a fecha 15 de Febrero de 2021, la obra estaría finalizada a un 71 %, con los siguientes trabajos de partidas de obra sin finalizar:

- Partidas N° 9 y N° 10, Terminada sin finalizar, terminaciones de cal, la restitución e integración de pisos y la implementación de la iluminación y sistemas de alarma y monitoreo respectivamente.
- Partida N° 12, Terminada sin actuación en el 50% de la imaginería comprometida.
- Partida N° 13, Terminada sin la habilitación museográfica.
- Partidas N° 8 y N° 11, No tendrían ningún tipo de actuación.

Considerando todo lo expuesto, solicitamos formalmente la suplementación y re-itemización de recursos para el correcto cumplimiento de los alcances del proyecto y la restauración integral del templo. Y quedamos atentos para firmar los anexos de convenio vigentes y formalizar la suplementación y re-itemización requerida por esta iniciativa del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, solicitada por la comunidad del templo andino Virgen de La Asunción de Ticnámar.

Tabla 1. Comparativa del presupuesto del convenio versus la re-itemización de las partidas en las que se ha incurrido en un aumento imprevisto de presupuesto debido a la situación actual de pandemia COVID 19.

	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	Ppto. Aprobado	Real a la fecha	Nuevo Ppto.	Saldo / Déficit
1.	Trabajos previos	11.245.500	8.587.816	96.768.859	
2.	Cimbrado y apuntalamiento	2.439.500	2.436.809	2.439.500	0
3.	Implementación del plan de manejo arqueológico	19.040.000	1.331.933	19.040.000	0
4.	Desarmes	9.629.361	0	9.629.361	0
5.	Consolidación de fundaciones	9.282.000	372.956	9.282.000	0
6.	Reestructuración, consolidación, restauración de arcos, muros y contrafuertes	40.070.418	15.233.511	40.070.418	0
7.	Restitución de la techumbre del templo	77.824.001	2.975.000	77.824.001	0
8.	Intervención en la torre-campanario	21.338.336	3.421.834	21.338.336	0
9.	Terminaciones	65.687.286	368.000	65.687.286	0
10.	Instalaciones e iluminación del conjunto religioso	13.804.000	0	13.804.000	0
11.	Obras exteriores	24.891.230	0	24.891.230	0
12.	Restauración de bienes culturales	48.778.100	2.608.604	48.778.100	0
13.	Obras complementarias	38.675.000	36.088.194	70.864.199	
14.	Personal administrativo para la restauración	76.634.903	23.627.616	81.153.786	
VALOR TOTAL GASTOS DIRECTOS		459.339.635	97.052.273	581.571.075	
15.	Gastos generales	118.544.510	11.114.987	135.683.488	
VALOR TOTAL		577.884.145	108.167.260	717.254.563	
16.	Servicio de responsabilidad de ejecución	57.788.414	34.673.048	71.725.456	
17.	Permiso municipal (1% de la intervención en el templo)	5.778.841	5.778.841	5.778.841	0
VALOR TOTAL INCLUIDO EL PERMISO DE EDIFICACION		641.451.401	148.619.149	794.758.861	

RESUMEN	
Sobrecostos	153.307.460
Nuevo presupuesto	794.758.861

Sin otro particular y esperando su buena acogida, saluda atentamente,

Cristian Heinsen

Cristian Heinsen
Director Ejecutivo
Fundación Altiplano





Informe estado de resultados nivel técnico JULIO 2020

Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tienámar, BIP.40003075-0
Elaborado 13 de Agosto de 2020


ARICA Y PARINACOTA



CORE
CONSEJO REGIONAL
DE ARICA Y PARINACOTA

E: 0047

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Ticnámbar

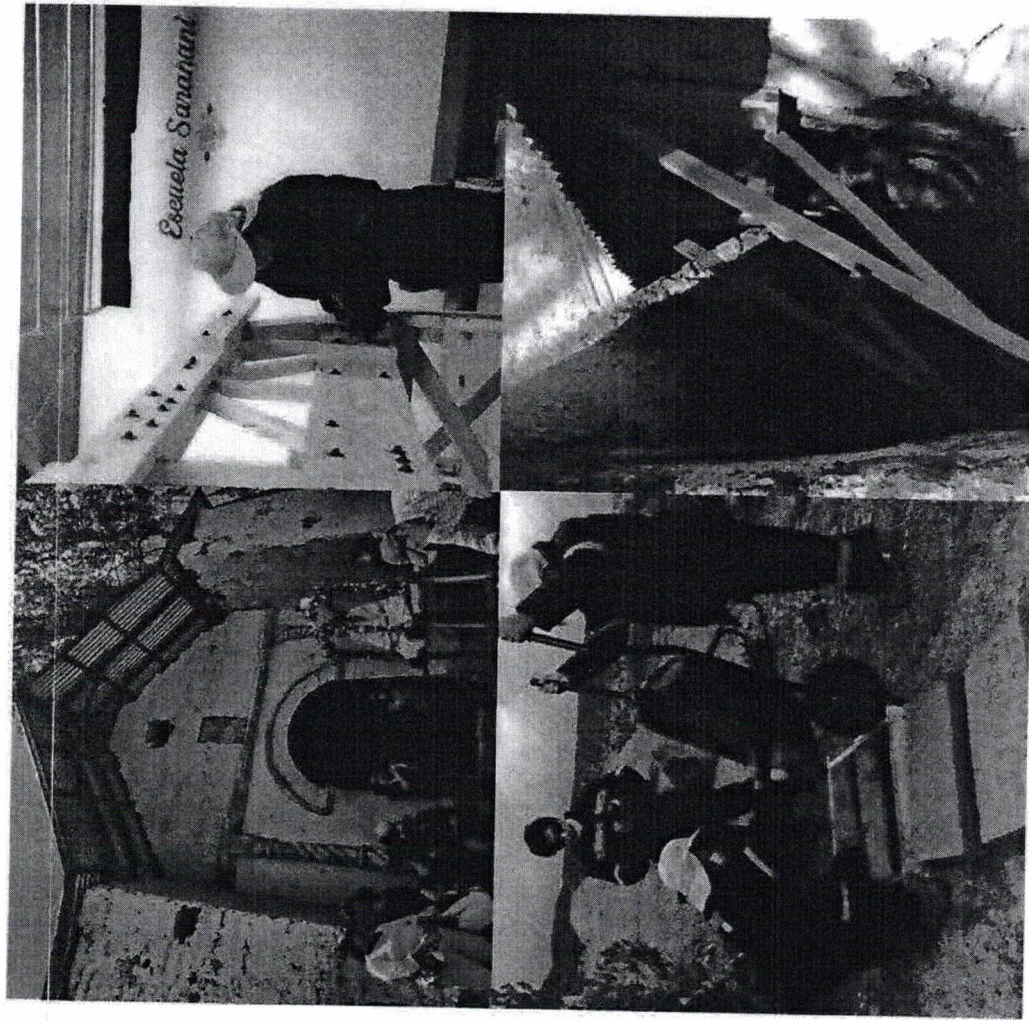

Código Bip. 40003075-0

Resumen avance proyecto a:
31 de julio 2020

Programa Puesta en Valor del
Patrimonio
PPVP Gore Ayp SUBDERE

Sub-ejecución de Fundación Altiplano

Firma convenio: octubre 2019

Inicio de actividades: Enero 2020

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Ticnámbar



Presupuesto aprobado

Personas	MM\$ 315
Operación	MM\$ 144
Difusión	MM\$ 5
Gastos generales	MM\$ 113
Resp. ejecución	MM\$ 58
Permiso edificación	MM\$ 6
Costo total	MM\$ 641

Resultados a lograr

Restauración integral del templo	1
Documental de la restauración	1
Libro pdf de la restauración	1
Web www.restauraticnamar.cl	1
N° Contratos personas (realizados/total)	10/51
% personas comunidad andinas región AyP	68%
Remuneración mínima	\$500.000
Servicios Locales contratados	9
Contratación de servicios en comunidad	MM\$ 90
Reuniones con comunidad (realizadas/total)	14/35
Escuelas taller (realizadas/total)	5/46
Horas capacitación teóricas (realizadas/total)	10/140
Pasantías	2
Voluntariados	2
Alianzas	2

Transferencias realizadas

Fecha de transferencia	Monto transferido	Total transferido	Saldo pendiente segunda cuota
Diciembre 2019	\$209.158.645	\$409.158.645	\$ 232.292.756
Abril 2020	\$200.000.000		

Rendición a la fecha (Julio)

Personas	MM\$ 63
Operación	MM\$ 34
Difusión	MM\$ 1
Gastos generales	MM\$ 11
Resp. ejecución	MM\$ 34
Permiso edificación	MM\$ 5,7
Total Rendido	MM\$ 149

La última rendición aprobada sin observaciones por el GORE es la de Mayo 2020 a expensas de envío del ordinario de respuesta por parte de GORE.

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Ticnámbar



Resumen Técnico. Se presentan las partidas del proyecto aprobado y en curso, con detalle del % de avance programado y real a la fecha. No se refieren en la tabla las tareas profesionales que exige la puesta en marcha del proyecto y que se han realizado a la fecha: actualización de proyecto aprobado por Consejo de Monumentos Nacionales, actualización de propuesta económica, permisos legales ante MINVU, diseño de partidas no previstas, convocatorias, selección y capacitación de equipo técnico y profesional, informes técnicos, informes económicos, control de gestión, etc.

	Partidas de obra	% Prog.	% Real
1	Trabajos Previos	100%	77%
2	Cimbrado y apuntalamiento	100%	100%
3	Implementación del Plan de Manejo Arqueológico	56%	36%
4	Desarmes y liberaciones controlados	50%	0%
5	Consolidación de fundaciones	100%	0%
6	Consolidación de arcos, muros y contrafuertes	10%	17%
7	Restitución de la techumbre del templo	57%	0%
8	Restauración de torre-campanario	49%	12%
9	Terminaciones	9%	3%
10	Instalaciones e iluminación sostenible	0%	0%
11	Obras exteriores	25%	0%
12	Restauración de bienes culturales (Imaginería, retablo, carpinterías)	58%	2%
13	Obras complementarias	29%	48%
	TOTAL AVANCE %	50%	21%

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Ticonamar



Impacto Covid-19 en proyecto en curso

Impacto Financiero:

- Sobre costos de MM\$ 153, equivalente a un 24% del ppto aprobado.

Impacto Operacional:

- Pausa Operaciones desde el 17 de marzo.
- Remuneraciones de emergencia para personas de comunidad en el proyecto. Teletrabajo y capacitación a distancia.
- Implementación Escuela Taller en Arica para continuidad de partidas de instalaciones de faena y sobre cubierta de protección.
- Elaboración de protocolo COVID-19 en permanente actualización
- Adaptación de proyecto a contingencia sanitaria. Realización de test rápido y PCR. (Estimados 60/mes).
- Diseño e implementación de campamento autónomo a solicitud de comunidad.
- Elaboración de proyecto de electrificación, proyecto de saneamiento y red de agua potable del campamento.
- Aumento de 4 meses (12+4) = 16 meses. Fecha cierre programado mayo 2021.

Reinicio de Obra:

- Reinicio aprobado por Comité del proyecto, Gore y Municipalidad de Putre.
- Inicio de implementación de campamento, agosto 2020.
- Inicio de trabajos de restauración 21.09.2020.

Se requiere por parte de mandante GORE AyP:


- Transferencia remesa final del convenio. Fecha límite 30.09.2020
- Gestión de reitemización ,tramitación de la suplementación y transferencia. Fecha límite 02.01.2021

Impacto COVID-19 en costos

Personas	MM\$ 7
Operación	MM\$ 115
Difusión	MM\$ 0
Gastos generales	MM\$ 17
Permiso edificación	MM\$ 0
Total Sobre costos	MM\$ 139
Resp. ejecución	MM\$ 14
Total sobre costo respecto convenio vigente	MM\$ 153

Impacto COVID-19 en avance

Control de carta Gantt Restauración de la Iglesia de Ticonamar

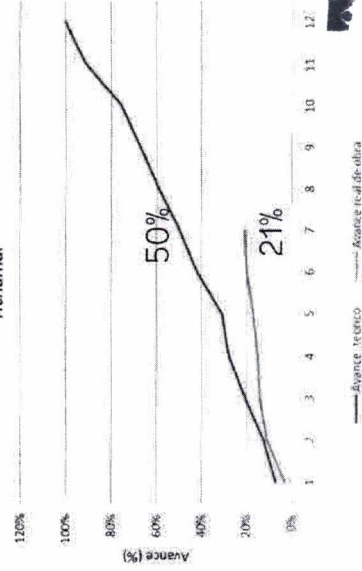

• 0043

La actualización del presupuesto del proyecto de restauración se debe a la actual situación de pandemia mundial que nos afecta desde el mes de marzo del 2020. Los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud nos han obligado a incrementar costos en temas relacionados a la prevención y contención del COVID 19, como la implementación de test rápidos y PCR a los trabajadores de FA y de comunidad, aumento del número de transportes para la movilidad de los trabajadores, o la instalación de un campamento independiente en Ticnámbar, entre otros requerimientos.

Resumen explicativo de tabla anexa:

- El incremento en la partida N°1 Trabajos previos, se debe al costo de la implementación de un campamento temporal aislado demandado por la comunidad para el inicio de las obras. Esta partida incluye a su vez, los sobre costos asociados a protocolos sanitarios COVID-19 como son, exámenes e implementos de seguridad personal.
- No existe variación entre las partidas N°2 hasta la N°12, manteniéndose el costo inicial de la partida establecida por convenio.
- El aumento en la partida N°13, se debe al cambio de EETT, en la partida de Obras Complementarias, subpartida 13.2 Sobrecubierta temporal, declarada en el proyecto de restauración y que se ha debido ajustar en cumpliendo con normativa vigente.
- El aumento de la partida N°15 Gastos generales, responde al incremento de la subpartida 15.1.1: Alojamientos, debido al costo de arriendo de módulos contenedores del campamento, y a la subpartida 15.1.8: Transporte de trabajadores, sobre costos asociados a protocolos sanitarios COVID-19, por el aumento del número de transportes adicionales por el distanciamiento social necesario para la seguridad de los trabajadores.

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Ticnámbar



CASO 1: Análisis comparativo de presupuestos considerando suplementación presupuestaria para finalizar el proyecto.

	DESCRIPCION DE PARTIDAS	Ppto. Aprobado	Real a la fecha	Nuevo ppto	SALDO / DEFICIT
1.	Trabajos previos	11,245.500	8,587.816	96,768.859	85,523.359
2.	Cimbrado y apuntalamiento	2,439.500	2,436.809	2,439.500	0
3.	Implementación del plan de manejo arqueológico	19,040.000	1,331.933	19,040.000	0
4.	Desarries	9,629.361	0	9,629.361	0
5.	Consolidación de fundaciones	9,282.000	372.956	9,282.000	0
6.	Reestructuración, consolidación, restauración de arcos, muros y contrafuertes	40,070.418	15,233.511	40,070.418	0
7.	Restitución de la techumbre del templo	77,824.001	2,975.000	77,824.001	0
8.	Intervención en la torre-campanario	21,338.336	3,421.834	21,338.336	0
9.	Terminaciones	65,687.286	368.000	65,687.286	0
10.	Instalaciones e iluminación del conjunto religioso	13,804.000	0	13,804.000	0
11.	Obras exteriores	24,891.230	0	24,891.230	0
12.	Restauración de bienes culturales	48,778.100	2,608.604	48,778.100	0
13.	Obras complementarias	38,675.000	36,088.194	70,864.199	-32,189.199
14.	Personal administrativo para la restauración	76,634.903	23,627.616	81,153.786	-4,518.883
	VALOR TOTAL GASTOS DIRECTOS	459,339.635	97,052.273	581,571.075	-122,231.441
15.	Gastos generales	118,544.510	11,114.987	135,683.488	-17,138.978
	VALOR TOTAL	577,884.145	108,167.260	717,254.563	-139,370.419
16.	Servicio de responsabilidad de ejecución	57,788.414	34,673.048	71,725.456	-13,937.042
17.	Permiso municipal (1% de la intervención en el templo)	5,778.841	5,778.841	5,778.841	0
	VALOR TOTAL INCLUIDO EL PERMISO DE EDIFICACION	641,451.401	148,619.149	794,758.861	-153,307.460

RESUMEN	
Sobrecostos	153,307.460
Nuevo presupuesto	794,758.861

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Ticnámbar



CASO 1: Flujo de caja considerando valor total de convenio + suplementación presupuestaria

Transferencias realizadas	
Diciembre 2019	\$209.158.645
Abril 2020	\$200.000.000
Total Transferido	\$409.158.645
Transferencias pendientes	
Noviembre 2020	\$232.292.756
Transferencia suplementaria	
Enero 2020	\$153.307.460

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Ingresos										
Saldo de caja agosto 2020	\$260.539.496									
Transferencia	\$0	\$0	\$0	\$232.292.756	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Suplementación						\$153.307.460				
Total Ingresos	\$260.539.496	\$0	\$0	\$232.292.756	\$0	\$153.307.460	\$0	\$0	\$0	\$0
Egresos										
Pagos por mes proyecto	\$84.042.744	\$75.270.572	\$70.717.103	\$61.271.374	\$58.057.312	\$71.939.231	\$67.682.739	\$63.905.579	\$51.569.749	\$4.630.901
Servicio de Responsabilidad de ejecución				\$23.115.366		\$13.937.042				
Total Egresos	\$84.042.744	\$75.270.572	\$70.717.103	\$84.386.740	\$58.057.312	\$85.876.273	\$67.682.739	\$63.905.579	\$51.569.749	\$4.630.901
Flujo de caja	\$176.496.752	\$101.226.180	\$30.509.078	\$178.415.093	\$120.357.781	\$187.788.968	\$120.106.230	\$56.200.651	\$4.630.901	\$0

El mes crítico para el ingreso de la remesa suplementaria, es el mes de enero del 2021 (01.01.2021) con esta suplementación el fin de la obra tendría lugar el 1 de Mayo de 2021 y se procedería al cierre administrativo del proyecto.

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Ticnámbar



CASO 1: Carta Gantt de obra con suplementación presupuestaria

La actualización financiera tiene como consecuencia la reestructuración de la carta Gantt de partidas de obra, la Gantt esta estructurada atendiendo al cierre según el caso 1 expuestos anteriormente con suplementación financiera.

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	2020					2021				
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
1	Trabajos previos										
2	Cimbrado y apuntalamiento										
3	Implementación del plan de manejo arqueológico										
4	Desarmes										
5	Consolidación de fundaciones										
6	Reestructuración, consolidación, restauración de arcos, muros y contrafuertes										
7	Restitución de la techumbre del templo										
8	Intervención en la torre-campanario										
9	Terminaciones										
10	Instalaciones e iluminación del conjunto religioso										
11	Obras exteriores										
12	Restauración de bienes culturales										
13	Obras complementarias										

Si el proyecto declara su cierre en el mes de mayo de 2021 con suplementación presupuestaria, la obra estaría finalizada a un 100 % en el mes de abril y el cierre administrativo se realizaría en mayo de 2021.

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Ticnámbar



CASO 2: Flujo de caja considerando valor total de convenio sin suplementación presupuestaria

Transferencias realizadas	
Diciembre 2019	\$209.158.645
Abril 2020	\$200.000.000
Total Transferido	\$409.158.645
Saldo	\$232.292.756

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Ingresos										
Saldo de caja agosto 2020	\$260.539.496									
Transferencia	\$0	\$0	\$0	\$232.292.756	\$0	\$0	\$0			
Total Ingresos	\$260.539.496	\$0	\$0	\$232.292.756	\$0	\$0	\$0			
Egresos										
Pagos por mes proyecto	\$84.042.744	\$75.270.572	\$70.717.103	\$61.271.374	\$58.057.312	\$71.939.231	\$48.418.550			
Servicio de Responsabilidad de ejecución				\$23.115.366						
Total Egresos	\$84.042.744	\$75.270.572	\$70.717.103	\$84.386.740	\$58.057.312	\$71.939.231	\$48.418.550			
Flujo de caja	\$176.496.752	\$101.226.180	\$30.509.078	\$178.415.093	\$120.357.781	\$48.418.550	\$0			

El mes crítico para ingreso de la remesa faltante del último pago de convenio, es el mes de noviembre (01/11/2020), con esto los pagos de obra están asegurados hasta el mes de enero del 2021 y se procedería al cierre administrativo del proyecto y de la obra, el 15 de febrero de 2021.

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Ticnámbar



CASO 2: Carta Gantt de obra sin suplementación presupuestaria

La actualización financiera tiene como consecuencia la reestructuración de carta Gantt de partidas de obra, la Gantt esta estructurada atendiendo al cierre según los casos 1 y 2 expuestos anteriormente.

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	2020												2021				
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO								
1	Trabajos previos																	
2	Cimbrado y apuntalamiento																	
3	Implementación del plan de manejo arqueológico																	
4	Desarries																	
5	Consolidación de fundaciones																	
6	Reestructuración, consolidación, restauración de arcos, muros y contrafuertes																	
7	Restitución de la techumbre del templo																	
8	Intervención en la torre-campanario																	
9	Terminaciones																	
10	Instalaciones e iluminación del conjunto religioso																	
11	Obras exteriores																	
12	Restauración de bienes culturales																	
13	Obras complementarias																	

Si el proyecto declara su cierre el 15 de Febrero de 2021, la obra estaría finalizada a un 71 %. Esto supone el término al 100% de las partidas de la 1 a la 7.

El 29% restante se desglosa en:

- Partidas 9 y 10, quedaría sin realizar, terminaciones de cal, la restitución e integración de pisos y la implementación de la iluminación y sistemas de alarma y monitoreo respectivamente.
- En el caso de la partida 12, bienes culturales se finalizaría el 100% del retablo y el 30% de la imaginería comprometida. La partida 13 restaría únicamente la habilitación museográfica.

Las partidas 8 y 11 no tendrían intervención.

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Tichnámbar




Resumen implementación de campamento a julio 2020.

Objetivo: Implementación de campamento aislado y autónomo para que el equipo de personas puedan realizar la restauración del templo en estado de emergencia. El reinicio de obra está previsto a partir del 01 de septiembre de 2020, tras pausa responsable de 5 meses y en estrecha coordinación con comunidad. El protocolo Covid 19 ha sido actualizado y revisado por la ACHS, mutual de afiliación de FA para cumplir con las nuevas normativas de los Ministerios de Salud y de Trabajo.

Fecha definitiva de reinicio de obra en Tichnámbar 100% capacidad operativa 21.09.20

Actividades próximas a realizar en agosto del 2020:

- Elaboración de proyectos para MINVU de electrificación, saneamiento y agua potable.
- Inicio de obras de acondicionamiento de terreno.
- Contratos de arriendo de módulos y proveedores de insumos.
- Inicio de traslado de material de obra (sobrecubierta, cierre, faena...) 19.08.2020
- Inicio de trabajos en obra con grupo reducido de maestros FA con centro base en la Estrella según protocolo 24.08.2020
- Reunión extraordinaria de Comité del proyecto Viernes 21.08.2020 para información sobre reinicio de obra

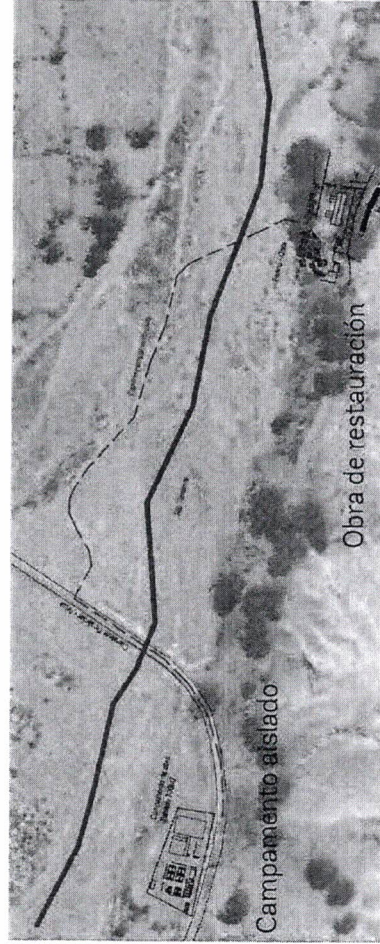

Ubicación del campamento y de la obra de restauración en Tichnámbar

Estado proyecto Restauración Templo Virgen Asunción de Tichnamar



PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAMENTO TICHNAMAR	
	DESCRIPCIÓN
1	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN CAMPAMENTO
1.1	Proyecto sanitario Minsal
1.2	Ingreso a Minsal
1.3	Arriendo terreno
2	INSTALACION ELECTRICA PARA CAMPAMENTO RED PUBLICA
	Conexión a empalme de red pública existente mediante postación y cableado aéreo, para habilitar con electricidad 16 módulos del campamento.
3	DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
3.1	Instalación de red de agua potable
	Instalación de 3 estanques, una bomba de agua y conexiones de tubería para comedor y baños del campamento.
3.2	Traslado de aljibe TRANSPORTES ARAYA E.I.R.L
	Abastecimiento de agua potable desde la ciudad de Arica a campamento ubicado en las cercanías de pueblo de Tichnamar por 9 meses, un viaje por semana con un total de 36 viajes a \$300.000 por viaje valor NETO.
3.3	Agua potable planta Aguarrica S.A
3.3.1	Suministro de agua potable en planta de Aguarrica con cumplimiento de norma chilena 409. Costo por M3 de \$3.100 IVA incluido, se suministrarán 15 M3 de agua por 36 semanas completando un total de 9 meses de suministro.
3.4	Ppto instalación de alcantarillado ISRAEL QUISPE
	Instalación de red de alcantarillado el cual contempla conexiones, cámaras de registro, fosa séptica y drenes.
3.5	Mantenimiento fosa séptica SALITREAR IRMA
3.5.1	Extracción de líquidos de fosa Precio por viaje es de \$500.000 NETO. Un total de 5 Viajes durante 9 meses distribuidos cada 2 meses
3.6	Presupuesto de materiales agua potable y alcantarillado ítem 1-2 cotización de LONZA N° 0080/2020AR-
3.6.1	Materiales implementación red de agua potable en campamento.
3.6.2	Materiales implementación red de alcantarillado y fosa séptica para campamento.
4	EMPLAZAMIENTO CAMPAMENTO
	Habilitación del terreno mediante movimientos de tierra y ensayos de calidad para la instalación de módulos.
5	INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO
5.1	Arriendo módulos 9 meses y o, montaje, retiro y desmontaje de módulos. Anaketa Group
5.2	Transporte de módulos Arica- Tichnamar
6	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS FULL CAPACIDAD 32pax EASY
6.1	Mobiliario módulos pieza COTIZACION V.0323462558
6.2	Mobiliario módulos comedor COTIZACION V.0323462617
6.3	Mobiliario módulos baño COTIZACION V.0323462368
	SUBTOTAL
	Exámenes Covid19
	Permiso de instalación de faena Minvu
	TOTAL

R. 0035

Como entidad sub-ejecutora a cargo de la iniciativa de Gobierno Regional de Arica y Parinacota, solicitada por la comunidad del templo andino de Tichámar, hacemos ver que la continuidad de la sub-ejecución de esta iniciativa tan relevante para la comunidad y la región, de acuerdo al convenio vigente, exige un esfuerzo extraordinario de la entidad sub-ejecutora, asumiendo costos, riesgos y dificultades extraordinarias y nunca previstas, derivadas de la Emergencia mundial COVID-19 que nos afecta, que vienen a aumentar la alta complejidad de esta iniciativa patrimonial que ha requerido el servicio de sub ejecución PPVP. La disposición de la Fundación Altiplano como entidad sub-ejecutora no responde a ningún incentivo económico, que no existe para ninguna iniciativa de sub ejecución PPVP, sino sólo al compromiso de apoyo adquirido con la comunidad del templo de Tichámar, en sintonía con la misión institucional de acompañar a comunidades que necesitan conservar sus tesoros patrimoniales. Para poder lograr cumplir con la restauración del templo en estas condiciones de extrema emergencia, será necesario contar con la mayor colaboración posible de parte de Gobierno Regional, Comunidad del Templo y de todas las instituciones vinculadas al proceso de restauración.

Equipo de Fundación Altiplano, agosto 2020
